LAPORAN BULAN - 6

PERIODE :

14 Juni 2026 s/d 13 Juli 2026

PAKET PEKERJAAN

MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN TERPADU

UIN
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI

KONSULTAN PELAKSANA

PT. ENESTE

DAFTAR ISI.

Lembaran Penyesahan
Daftar Isi.
Kata Pengantar.

Bab 1 : PENDAHULUAN.

1.1. Latar Belakang.
1.2. Peta Lokasi Proyek.
1.3. Lingkup Kegiatan.
1.3.1. Data Kegiatan.
1.3.2. Data Kontrak.
1.3.3. Lingkung Pekerjaan Bulan ini.
1.4. Waktu Pelaksanaan.

Bab 2 : PROGRES DAN KEGIATAN.

2.1. Progres Pekerjaan Bulanan.
2.2. Pekerjaan Perencanaan.
2.2.1 Kegiatan Bulan ini.
2.2.2. Rencana Kegiatan Bulan Depan.
2.2.3. Masalah dan Tindak Lanjut.

Bab 3 : LAPORAN VISUAL

3.1. Foto Umum
3.2. Foto Kegiatan

Bab 4 : KESIMPULAN DAN SARAN.

LAMPIRAN :

KATA PENGANTAR

Sebagai realisasi kontrak kerja antara UIN Syech Djamil Djambek Bukittinggi, Kab. Agam, Provinsi Sumatera Barat mengenai Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu diwajibkan untuk menyusun laporan-laporan yang salah satunya Laporan Bulanan.

Laporan Bulanan dalam kontrak ini meliputi penjelasan tentang semua kegiatan dalam Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik terhadap Kontraktor Pelaksana **PT. MATRA KARYA-AZA BANAR KSO** dalam melaksanakan pekerjaan Konstruksi Fisik. Tujuan dari dari disusunnya Laporan Mingguan ini adalah untuk melakukan Monitoring serta Evaluasi dalam pelaksanaan pekerjaan Pekerjaan Fisik terhdapap Kontraktor Pelaksana.

Demikian Laporan Bulanan ini disusun dan harapan dapat digunakan untuk melakukan monitoring serta evaluasi kemajuan pekerjaan secara keseluruhan sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu.

LAPORAN BULAN KE 06

(Periode 14 Juni 2026 s/d 13 Juli 2026)
Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu

Lokasi : Jl.Gurun Aur,Kenagarian Kubang Putih, Kec Banuhampu, Kab. Agam, Sumatera Barat

BAB 1
PENDAHULUAN.

1.1. LATAR BELAKANG.

Dalam rangka menjaga kualitas hasil pekerjaan maka diperlukan suatu pengendalian mutu proses serta persyaratan-persyaratan yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Hal ini diharapkan pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik sehingga produk akhir pekerjaan sesuai dengan syarat teknis yang tercantum dalam kontrak. Laporan Bulanan dalam kontrak ini meliputi penjelasan tentang semua kegiatan dalam Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik terhadap Kontraktor Pelaksana **PT. MATRA KARYA-AZA BANAR KSO** dalam melaksanakan pekerjaan Konstruksi Fisik yang diuraikan secara rinci, lengkap, jelas sesuai dengan tahapan kegiatan yang disyaratkan dalam dokumen kontrak.

Laporan ini pula yang digunakan sebagai alat kontrol/pengendali terhadap mutu, waktu dan biaya suatu pekerjaan sehingga bila terjadi penyimpangan dapat ketahui lebih awal. Dengan demikian diharapkan mutu serta waktu dan biaya pekerjaan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan yang diharapkan.

1.2. PETA LOKASI PROYEK.

Lokasi pada Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu UIN Syech Djamil Djambek Bukittinggi, Kab. Agam, Provinsi Sumatera Barat, Jl.Gurun Aur,Kenagarian Kubang Putih, Kec Banuhampu, Kab. Agam, Sumatera Barat



1.3. LINGKUP KEGIATAN.

1.3.1. DATA KEGIATAN.

Uraian data kegiatan pada pekerjaan ini adalah sebagai berikut :

Nama Pekerjaan	:	Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu
Pengguna Jasa Konstruksi	:	Pejabat Pembuat Komitmen UIN DJAMIL DJAMBEK Bukittinggi
Alamat Proyek	:	Jl. Gurun Aur,Kenagarian Kubang Putih, Kec Banuhampu, Kab. Agam, Sumatera Barat
Penyedia Jasa Konstruksi	:	-
Konsultan Pengawas	:	**PT. ENESTE**

1.3.2. DATA KONTRAK.

A. Konsultan MK

Pekerjaan	:	Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu.
Lokasi Pekerjaan	:	Jl. Gurun Aur, Kenagarian Kubang Putih, Kec Banuhampu, Kab. Agam, Sumatera Barat
Konsultan Manajemen Konstruksi	:	**PT. ENESTE**
Nomor Kontrak	:	B-241/Un.26/KU.00.2/01/2026 Tanggal 15 Januari 2026.
Nomor Kontrak Add – I	:	B-1519.1/Un.26/KU.00.2/05/2026 Tanggal 13 Mei 2026
Sistem Kontrak	:	Waktu Penungasan.
Sistem Pembayaran		Man-mounth.
Alamat Konsultan Pengawas	:	Perkantoran Pondok Kelapa Blok C No. 1 Jl. Pondok Kelapa Raya, Duren Sawit Jakarta Timur 13450
Masa Pelaksanaan	:	351 (Tiga Ratus Lima Puluh Satu) Hari Kalender.
Sumber Dana	:	SBSN-APBN 2026

B. Penyedia Jasa Konstruksi

Pekerjaan	:	Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu.
Penyedia Jasa	:	PT. MATRA KARYA-AZA BANAR KSO
Nomor Kontrak	:	B-236/Un.26/KU.00.2/01/2026 Tanggal 25 Mei 2026.
Nomor SPMK	:	B-1649/Un.26/KU.00.2/05/2026 Tanggal 25 Mei 2026.
Alamat Penyedia Jasa Konstruksi	:	Jl. Palagan Tentara Pelajar RT/RW 005/035 Jongkang Sariharjo, Sleman-Sleman (kab), Yogyakarta
Masa Pelaksanaan	:	210 (Dua ratus sepuluh) Hari Kalender.
Sumber Dana	:	SBSN-APBN 2026

1.3.3. LINGKUP PEKERJAAN.

Lingkup pekerjaan yang di rencanakan yang akan dilaksanakan dalam proyek Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu meliputi pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut :

A. Pekerjaan Standar

I. Pekerjaan Persiapan

II. Pekerjaan Arsitektur

2.1 Pekerjaan Pasangan dan Pelapis Dinding

2.2 Pekerjaan Pasangan Lantai

2.3 Pekerjaan Pasangan Plafond

2.4 Pekerjaan Pasangan Sanitair

2.5 Pekerjaan Pengecatan

2.6 Pekerjaan Pemasangan Railing dan Hand Railing

III. Pekerjaan Mekanikal dan Plumbing

3.1 Pekerjaan Sistem Air Bersih

3.2 Pekerjaan Sistem Air Panas

IV. Pekerjaan Elektrikal

4.1 Pekerjaan Panel

4.2 Pekerjaan Kabel Feeder

4.3 Pekerjaan Titik Instalasi Penerangan dan Daya

B. Pekerjaan Non Standar

I. Pekerjaan Arsitek

1.1 Pekerjaan Pasangan dan Pelapis Dinding

1.2 Pekerjaan Pasangan Lantai dan Plafond

1.3 Pekerjaan Pasangan Pintu dan Jendela

1.4 Pekerjaan Fasade

II. Pekerjaan Mekanikal dan Plumbing

2.1 Pekerjaan Pemadam Kebakaran

2.2 Pekerjaan Fire Suspension

2.3 Pekerjaan Tata Udara Air Conditioning (AC)

2.4 Pekerjaan Sistem Ventilasi dan Ducting

2.5 Pekerjaan Titik Armatur Penerangan dan Daya

2.6 Pekerjaan Rak Kabel

2.7 Pekerjaan Sistem Telephone

2.8 Pekerjaan Tata Suara

2.9 Pekerjaan Sistem MATV

2.10 Pekerjaan Sistem CCTV

2.11 Pekerjaan Sistem Fire Alarm

1.4. WAKTU PELAKSANAAN.

Waktu pelaksanaan dari 14 Juni 2026 s/d 13 Juli 2026 sebagai berikut :

Waktu kontrak	:	351 hari	100,00 %
Waktu terpakai	:	175 Hari	49,86 %
Waktu tersisa	:	176 hari	50,14 %

BAB 2
PROGRES DAN KEGIATAN

2.1. Progres Pekerjaan Bulanan.

Sampai dengan Bulan ke 06 periode tanggal 14 Juni 2026 s/d 13 Juli 2026 progress pelaksanaan pekerjaan pada Proyek ini sebagai berikut :

2.2. Pekerjaan Pelaksanaan Fisik

2.2.1. Kegiatan Bulan ini :

Sampai Bulan ini kegiatan Pelaksanaan meliputi :

II.1. WAKTU PELAKSANAAN (KONTRAKTOR)

Total Waktu (Hari Kalender)	**Waktu Pelaksanaan** (Hari Kalender)	
	Waktu Terlaksana	**Sisa Waktu**
210	56	154

II.2. PERSENTASE PROGRESS KEGIATAN

Uraian Pekerjaan	**Rencana Komulatif Progress Pekerjaan** (%)	**Realisasi Komulatif Progress Pekerjaan** (%)	**Deviasi** (%)	**Keterangan**
Pelaksanaan : 1. Pek. Persiapan 2. Pek. Pengeboran Bore Pile 3. Pek. Galian untuk Pilecap 4. Pek. Urugan pasir dibawah Pilecap, tebal 100 mm 5. Pek. Rabat beton bawah pilecap, tebal 50 mm (1 pc 3 ps 5 kr) 6. Pek. Bekisting bata merah (5x11x22) cm tebal batu (camp. 1 sp 5 pp) 7. Pek. Penulangan Pilecap	**7,886**	**3,989**	**-3,897**	Lambat

8. Pek. Penulangan Kolom Pedestal				

II.3. PERALATAN YANG DI GUNAKAN :

1. Alat Bor Pile = 3 Set
2. Exavator PC 200 = 1 Unit
3. Bar Cutter = 1 Unit
4. Bar Bender = 1 Unit

2.2.3. Masalah dan Tindak Lanjut :

Adapun permasalahan yang ditemukan oleh Manajemen Konstruksi pada Bulan ini berikut solusinya, diantaranya:

Adapun permasalahan yang ditemukan oleh Manajemen Konstruksi pada Minggu ini berikut :

No.	Uraian	Tanggapan
1.	Kontraktor Pelaksana memerlukan waktu untuk : 1. Mobilisasi Personil dan Tenaga Kerja 2. Penggunaan Mesin Bore Pile kurang Memadai untuk melakukan Pengeboran	Di Instruksikan untuk melakukan Percepatan Disarankan Kepada Kontrktor Untuk mengganti mesin Pengeboran yang mempunyai Kekuatan yang lebih besar

BAB 3
LAPORAN VISUAL

3.1. FOTO UMUM

FOTO-FOTO KEGIATAN	
Rapat Koordinasi	
	
	

3.2 FOTO KEGIATAN LAPANGAN


FOTO-FOTO KEGIATAN	
Pelaksanan Lapangan	
Penulangan Pile Cape	
Safety Talk K3	

FOTO-FOTO KEGIATAN	
Penulangan Pile Cape	
Pengeboran Bor Pile	
Check List Kedalam Bore Pile	


FOTO-FOTO KEGIATAN	
Check List Tulangan Bore Pile	
Test Slump FC 28 untuk Bore Pile	
Pengecoran FC 28 untuk Bore Pile	

FOTO-FOTO KEGIATAN

Pek. Bekisting bata merah (5x11x22) cm tebal batu (camp. 1SP 5PP)

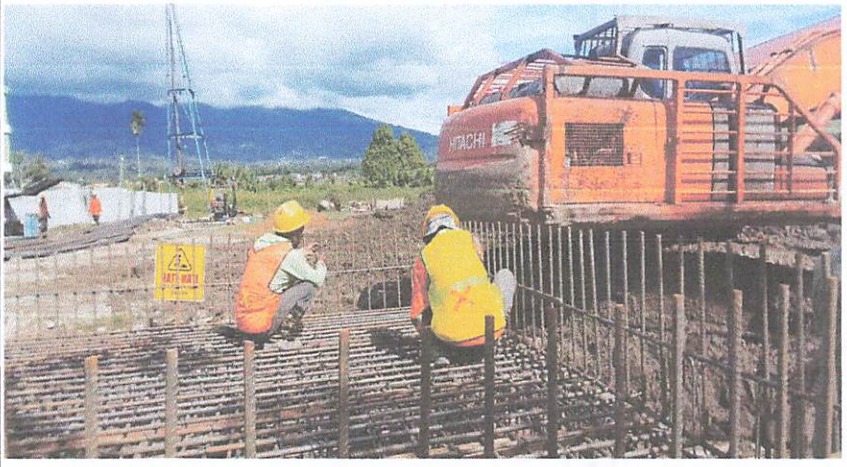

Penulangan Pile cape dan Penulangan Kolom Pedestal

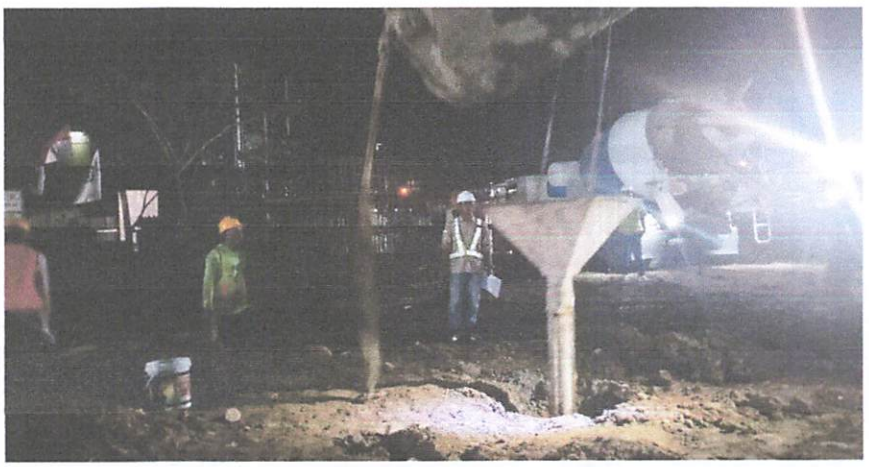

Check list penulangan Pile cape



FOTO-FOTO KEGIATAN	
Check List Penulanga Bore Pile	
Penulangan Kolom Pedestal	
Pengecoran Kolom Pedestal	

Slump Test untuk Pengecoran Kolom Pedestal	

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1. Kesimpulan.

Pelaksanaan Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu sudah mulai masa Kontrak.

3.2. Saran.

Agar Kontraktor Pelaksana Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu dapat menyegerakan persiapan dan mobilisasi Personil dan Tenaga Kerja serta mobilisasi Peralatan.

LAMPIRAN

Dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh konsultan manajemen konstruksi pada bulan ini, dalam laporan ini dilampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. **Surat Masuk**

No	Nomor Surat	Tanggal	Kepada	Perihal
1.	007/UIN.SMDD.BKT/MK-AB-KSO/UN/VI/2026	12 Juni 2026	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Peresentasi Vendor Lift
2.	014/UIN.SMDD.BKT/MK-AB-KSO/SK/VI/2026	22 Juni 2026	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Menyaksikan Uji Kuat Tekan Beton
3.	018/UIN.SMDD.BKT/MK-AB-KSO/SK/VI/2026	30 Juni 2026	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Pemberitahuan Kondisi Lapangan
4.	122a/S.KLR/PDC/VI/2026	2 Juli 2026	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Penyampaian Alternatif Penyesuaian Desain Pondasi
5.	133/S.KLR/PDC/VII/2026	7 Juli 2026	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Tanggapan RFI terkait

6.	027/UIN.SMDD.BKT/MK-AB-KSO/VII/2026	13 Juli 2026	Pejabat Pembuat Komitmen Konsultan Manajemen Konstruksi	kedalaman borepile Trial Mix, Batching Plant PT. Surya Pratama Mandiri

2. Surat Keluar

No	Nomor Surat	Tanggal	Kepada	Perihal
1.	004-Und/1/PT.ENESTE/VI/2026	22 Juni 2026	Rektor (Kuasa Pengguna Anggaran) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Satuan Pengawas Internal Tim PTBGN (Pengelola Teknis Bangunan Gedung Negara) Prov. Sumbar Site Manager PT. MATRA KARYA-AZA	Rapat Koordinasi
2.	005-Und/1/PT.ENESTE/VI/2026BANAR KSO dan Tim	22 Juni 2026	Rektor (Kuasa Pengguna Anggaran) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Satuan Pengawas Internal Tim PTBGN (Pengelola Teknis Bangunan Gedung Negara) Prov. Sumbar Site Manager PT. MATRA KARYA-AZA BANAR KSO dan Tim	Rapat Koordinasi
3.	005-Und/1/PT.ENESTE/VI/2026	30 Juni 2026	Rektor (Kuasa Pengguna Anggaran) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Satuan Pengawas Internal Tim PTBGN (Pengelola Teknis Bangunan Gedung Negara) Prov. Sumbar Site Manager PT. MATRA KARYA-AZA BANAR KSO dan Tim	Rapat Koordinasi
4.	006-Und/1/PT.ENESTE/VII/2026	7 Juli 2026	Rektor (Kuasa Pengguna Anggaran) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Satuan Pengawas Internal	Rapat Koordinasi

			Tim PTBGN (Pengelola Teknis Bangunan Gedung Negara) Prov. Sumbar Site Manager PT. MATRA KARYA-AZA BANAR KSO dan Tim	

PT. MATRA KARYA
General Contractor

PT. MATRA KARYA - PT. AZA BANAR KSO

ptazabanar
building | civil working | mechanical & electrical | landscaping

Bukittinggi, 15 Juni 2026

Nomor : 007/UIN.SMDD.BKT/MK-AB-KSO/UN/VI/2026
Lampiran : -
Perihal : **Undangan Rapat**

Kepada Yth.
Daftar Terlampir
Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun Anggaran 2026, dengan surat ini kami PT. Matra Karya – PT. Aza Banar KSO mengundang Bapak/Saudara untuk menghadiri rapat yang akan diadakan pada :

Hari/Tanggal	: Rabu, 17 Juni 2026
Waktu	: 10.00 WIB – Sampai Selesai
Tempat	: Ruang Meeting Direksi Keet Proyek Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Pembahasan	: ***Presentasi Vendor Lift***

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, diharapkan kehadirannya pada acara tersebut. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT. Matra Karya – PT. Aza Banar KSO

PT. MATRA KARYA - PT. AZA BANAR KSO

Kristiantoro, S.T.
Site Manager

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Pejabat Pembuat Komitmen
2. Konsultan Manajemen Konstruksi (PT. Eneste)

PT. MATRA KARYA
General Contractor

PT. MATRA KARYA - PT. AZA BANAR KSO

ptazabanar
building | civil working | mechanical & electrical | landscaping

Bukittinggi, 22 Juni 2026

Nomor : 014//UIN.SMDD.BKT/MK-AB-KSO/SK/VI/2026

Lampiran : -

Perihal : **Undangan untuk Menyaksikan Uji Beton**

Kepada Yth.
1. Pejabat Pembuat Komitmen
2. Tim Konsultan Manajemen Konstruksi

Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun Anggaran 2026, bersama ini kami PT. Matra Karya – PT. Aza Banar KSO mengundang Bapak/Saudara untuk *Menyaksikan Pengujian Tes Tekan Beton* yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal	: Selasa, 23 Juni 2026
Jam	: 16.00 WIB
Tempat	: Laboratorium Terpadu Universitas Negeri Padang

Demikian undangan ini kami sampaikan, mohon kehadirannya dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT. Matra Karya – PT. Aza Banar KSO



Kristiantoro, S.T.
Site Manager

PT. MATRA KARYA
General Contractor

PT. MATRA KARYA - PT. AZA BANAR KSO

Bukittinggi, 30 Juni 2026

Nomor : 018/UIN.SMDD.BKT/MK-AB-KSO/SK/VI/2026
Lampiran : 1 Bendel
Perihal : **Pemberitahuan Kondisi Lapangan**

Kepada Yth.
Bpk. Hendra Nasrul, M.Kom
Pejabat Pembuat Komitmen UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun Anggaran 2026, bersama ini kami PT. Matra Karya – PT. Aza Banar KSO menyampaikan bahwa kami telah melaksanakan pekerjaan Pengeboran Borepile menggunakan bor excavator pada titik kritis yang sudah disepakati bersama pada rapat mingguan hari rabu tanggal 24 Juni 2026 dengan hasil yang kami lampirkan bersama surat ini.

Maka dengan ini kami mohon solusi mengenai permasalahan tersebut agar pekerjaan tetap berjalan sehingga progress tidak terlambat.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT. Matra Karya – PT. Aza Banar KSO

PT. MATRA KARYA - PT. AZA BANAR KSO

Kristiantoro, S.T.
Site Manager

Tembusan :
1. Konsultan Manajemen Konstruksi (PT. Eneste)
2. Konsultan Perencana (PT. Pola Data Consultant)
3. Tim PTBGN (Pengelola Teknis Bangunan Gedung Negara) Prov. Sumatera Barat

PT. POLA DATA CONSULTANT (kso) PT. SURYA UNGGUL NUSA CONS

Yogyakarta, 2 Juli 2026

Nomor : 122a/S.KLR/PDC/VI/2026
Lampiran : 2 (dua) bundle
Hal : Penyampaian Alternatif Penyesuaian Desain Pondasi

Kepada Yth.
PPK Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu UIN Bukittinggi
Di –
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan pondasi bore pile di lapangan, berdasarkan hasil pemantauan dan informasi pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 24 sampai dengan 27 Juni 2026, diperoleh informasi bahwa **terdapat kendala pada proses pengeboran pondasi bore pile dengan menggunakan alat bor tipe auger dan tripod (yang tersedia di Lapangan pada surat ini dibuat) hingga mencapai kedalaman rencana pada elevasi -8,650 m.**

Kendala tersebut terjadi pada titik pondasi nomor 1, 4, 5, 24, 25, 26, 27, 28, 44, 45, 46, 47, 48, 49, dan 50, dimana proses pengeboran belum dapat mencapai kedalaman sesuai dengan dokumen hasil *value engineering* (VE).

Menindaklanjuti kondisi tersebut, serta untuk menjaga agar pelaksanaan pekerjaan tetap dapat berjalan tanpa mengurangi aspek keamanan dan waktu pelaksanaan, bersama surat ini kami menyampaikan alternatif penyesuaian desain pondasi sebagai solusi teknis apabila hingga saat surat ini diterbitkan proses pengeboran bore pile pada titik-titik tersebut masih mengalami kendala.

Adapun penyesuaian desain yang kami usulkan meliputi:

1. Pembesaran dimensi pondasi footplate sesuai hasil evaluasi perhitungan struktur.
2. Kekuatan pondasi dalam alternatif desain ini telah sepenuhnya ditahan oleh pondasi footplate.
3. Penyesuaian elevasi bottom borepile menjadi tidak terkunci pada elevasi -8.650 dari elevasi ±0.000 (elevasi lantai gedung).
4. Pekerjaan borepile dapat tetap dikerjakan dengan memaksimalkan hingga kedalaman yang dapat dicapai dengan alat bor yang tersedia di lapangan pada saat surat ini dibuat.
5. Kedalaman pengeboran tidak perlu dilanjutkan apabila telah mencapai elevasi -8.650 dari elevasi ±0.000 (elevasi lantai gedung).

6. Penyesuaian detail penulangan dan elemen struktur terkait sebagaimana tercantum pada gambar revisi dan dokumen perhitungan terlampir.

Penyesuaian desain ini disusun berdasarkan hasil informasi dari tim lapangan dengan tujuan mempertahankan kapasitas daya dukung pondasi sesuai persyaratan perencanaan serta memberikan alternatif yang dapat dilaksanakan sesuai kondisi aktual di lapangan.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Konsultan Perencana
PT. Pola Data Consultant kso
PT. Surya Unggul Nusa Cons

Ir. Juliansyah, S.T., IPM.
Direktur Teknik

Tembusan:

1. *Arsip*
2. *Tim Teknis*
3. *Konsultan Manajemen Konstruksi*
4. *Kontraktor Pelaksana*

PT. MATRA KARYA
General Contractor

PT. MATRA KARYA - PT. AZA BANAR KSO

ptazabanar
building | civil working | mechanical & electrical | landscaping

Bukittinggi, 13 Juli 2026

Nomor : 027//UIN.SMDD.BKT/MK-AB-KSO/SK/VII/2026

Lampiran : -

Perihal : **Undangan untuk Menyaksikan Trial Mix**

Kepada Yth.
1. Pejabat Pembuat Komitmen
2. Tim Konsultan Manajemen Konstruksi

Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun Anggaran 2026, bersama ini kami PT. Matra Karya – PT. Aza Banar KSO mengundang Bapak/Saudara untuk *Menyaksikan Trial Mix* yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Juli 2026

Jam : 11.00 WIB

Tempat : Bathcing Plant PT. Surya Pratama Mandiri Beton
Jl. Payakumbuh – Batusangkar, Sumatera Barat

Demikian undangan ini kami sampaikan, mohon kehadirannya dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT. Matra Karya – PT. Aza Banar KSO

PT. MATRA KARYA - PT. AZA BANAR KSO

Kristiantoro, S.T.
Site Manager

PT. ENESTE

Perkantoran Pondok Kelapa Blok C No. 2 Jl. Pondok Kelapa Raya Duren Sawit Jakarta Timur 13450,Telp. : (021) 865 0292, Fax. (021) 8649906
E -Mail : eneste_2002@yahoo.com

Bukittinggi, 22 Juni 2026

Nomor : 004-Und/1/PT.ENESTE/VI/2026
Lamp. : -
Perihal : Rapat Koordinasi

Kepada Yth,
1. Rektor (Kuasa Pengguna Anggaran)
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
4. Satuan Pengawas Internal
5. Konsultan Perencana PT. Pola Data Consultan JO Succons
6. Tim PTBGN (Pengelola Teknis Bangunan Gedung Negara) Prov. Sumbar
7. Site Manager PT. MATRA KARYA-AZA BANAR KSO dan Tim

Di

Tempat

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti Risalah Rapat No. 001/UIN-Bukittinggi/BA.Rapat/6/2026, Tanggal 15 Juni 2026 bertempat di Ruang Rapat Dinas BMCKTR, Bidang Cipta Karya, sesuai Rekomendasi pada Risalah Tersebut maka dengan ini kami sebagai Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu, Mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada Rapat Koordinasi yang akan diselenggarakan pada,

Hari/Tanggal	:	Rabu /24 Juni 2026
Waktu	:	10.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Direksi Keet PT. Matra Karya - AZA BANAR KSO Jl. Jalan Gurun Aur Kubang Putih Kab. Agam – Sumatera Barat
Acara	:	Rapat Koordinasi Pembahasan Prubahan Design

Demikian kami sampaikan untuk diperhatikan, atas kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,
PT. ENESTE

YOLENIO, ST
Team Leader

Tembusan Yth :
1. Arsip

PT. ENESTE

Perkantoran Pondok Kelapa Blok C No. 2 Jl. Pondok Kelapa Raya Duren Sawit Jakarta Timur 13450,Telp. : (021) 865 0292, Fax. (021) 8649906
E -Mail : eneste_2002@yahoo.com

Bukittinggi,30 Juni 2026

Nomor : 005-Und/1/PT.ENESTE/VI/2026
Lamp. : -
Perihal : Rapat Koordinasi

Kepada Yth,
1. Rektor (Kuasa Pengguna Anggaran)
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
4. Satuan Pengawas Internal
5. Tim PTBGN (Pengelola Teknis Bangunan Gedung Negara) Prov. Sumbar
6. Site Manager PT. MATRA KARYA-AZA BANAR KSO dan Tim

Di

Tempat

Dengan Hormat,

Sesuai dengan surat perjanjian (Kontrak) PT. MATRA KARYA – AZA BANAR KSO, No. B-1647/Un.26/KU.00.2/05/2026 tanggal 25 Mei 2026, dan sesuai SPMK No. B-1649/Un.26/KU.00.2/05/2026 tanggal 25 Mei 2026, Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu.

Bersama ini kami sebagai Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu, Mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada Rapat Koordinasi yang akan diselenggarakan Pada;

Hari/Tanggal	:	Rabu /01 Juli 2026
Waktu	:	10.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Direksi Keet PT. Matra Karya - AZA BANAR KSO Jl. Jalan Gurun Aur Kubang Putih Kab. Agam – Sumatera Barat
Acara	:	Pembahasan Progres yang Tercapai

Demikian kami sampaikan untuk diperhatikan, atas kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

PT. ENESTE
Hormat Kami,



YOEMO, ST
Team Leader

Tembusan Yth :
1. Arsip

PT. ENESTE

Perkantoran Pondok Kelapa Blok C No. 2 Jl. Pondok Kelapa Raya Duren Sawit Jakarta Timur 13450,Telp. : (021) 865 0292, Fax. (021) 8649906
E -Mail : eneste_2002@yahoo.com

Bukittinggi, 7 Juli 2026

Nomor : 005-Und/1/PT.ENESTE/VII/2026
Lamp. : -
Perihal : Rapat Koordinasi

Kepada Yth,
1. Rektor (Kuasa Pengguna Anggaran)
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
4. Satuan Pengawas Internal
5. Tim PTBGN (Pengelola Teknis Bangunan Gedung Negara) Prov. Sumbar
6. Site Manager PT. MATRA KARYA-AZA BANAR KSO dan Tim

Di

Tempat

Dengan Hormat,

Sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) PT. MATRA KARYA-AZA BANAR No. B-1647/Un.26/KU.00.2/05/2026, Tanggal 25 Mei 2026 dan sesuai SPMK NO. B-1649/Un.26/KU.00.2/05/2026 Tanggal 25 Mei 2026, Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu. Bersama ini kami sebagai Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu, Mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada Rapat Koordinasi yang akan diselenggarakan pada,

Hari/Tanggal	:	Rabu /8 Juli 2026
Waktu	:	10.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Direksi Keet PT. Matra Karya - AZA BANAR KSO Jl. Jalan Gurun Aur Kubang Putih Kab. Agam – Sumatera Barat
Acara	:	Pembahasan Persiapan Amandemen Kontrak PT. MATRA KARYA-AZA BANAR

Demikian kami sampaikan untuk diperhatikan, atas kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,
PT. ENESTE

YOSEPIO, ST
Team Leader

Tembusan Yth :
1. Arsip
